

# DEVOIR MAISON

3


## Planifier un projet

Page 1/1

### Planification

Soit la fabrication et l'assemblage d'un lot de vélos. Les différentes tâches ont été regroupées dans le tableau ci-dessous .

TACHES	DESCRIPTION	DURÉES (en jours)
A	Approvisionnement matières premières et composants	4
B	Fabrication fourche avant	2
C	Assemblage roue avant + freins sur la fourche	1
D	Fabrication guidon	2
E	Fabrication pédalier	1
F	Assemblage pédales et plateau	2
G	Fabrication cadre	3
H	Assemblage roue arrière + freins sur le cadre	2
I	Assemblage Avant	1
J	Assemblage du vélo	3
K	Contrôle final + conditionnement	1

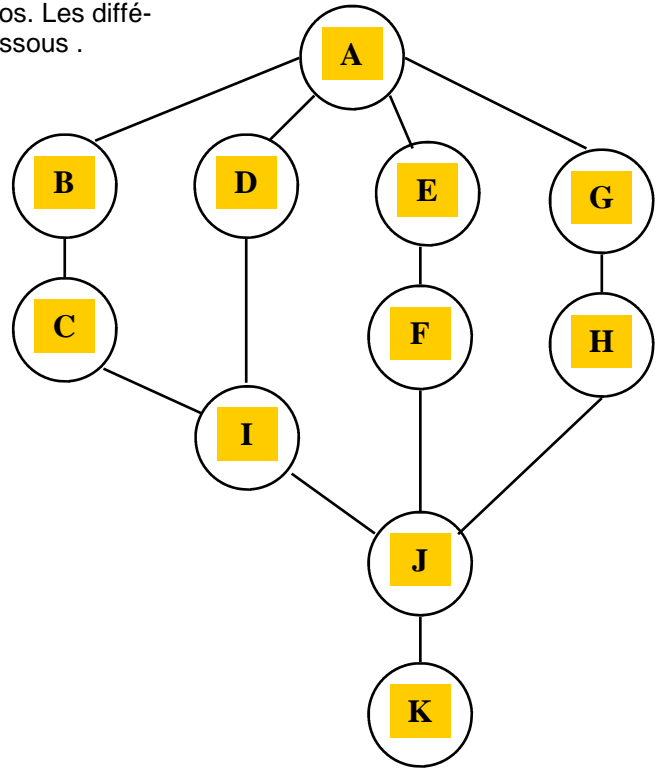

- 1.1 Compléter les tâches qui ont lieu avant
- 1.2 Compléter les tâches qui ont lieu après
- 1.3 Reporter les durées
- 1.4 Compléter les dates de Début et Fin

- 1.5 Compléter le diagramme en coloriant les cases
- 1.6 En déduire la durée totale de la réalisation du produit :

Tâches	Tâches qui ont lieu avant	Tâches qui ont lieu après	Durée En jours	Date de DEBUT	Date de FIN
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
H					
I					
J					
K					

Jours ▶ ▼Tâches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														

NOM :

CLASSE :

DATE :
